



LIFT & SHIFT IM MÜNSTERLAND

18. April 2024

AUSGANGSSITUATION

Die Verlagsgruppe Aschendorff agiert auf einer klassisch gewachsenen System-Infrastruktur mit Fokus auf SAP-Systemen. In 2021 fällt die Entscheidung, die Systemlandschaft radikal umzubauen und auf die Digitalisierung auszurichten.

ZIELSITUATION

Anstelle der bisherigen monolithischen Systemlandschaft soll ein ‚best of breed‘ Ansatz zum Einsatz kommen.



Dynamics 365




Die bisher genutzten SAP-Module MAM, MSD, HCM und FI werden abgekündigt.

BEGINN EINER REISE

Dragos Vlasceanu
besucht das 24.
Bremer
Verlagstreffen ...und
kommt mit Herrn
Greve ins Gespräch...

Mai
2023

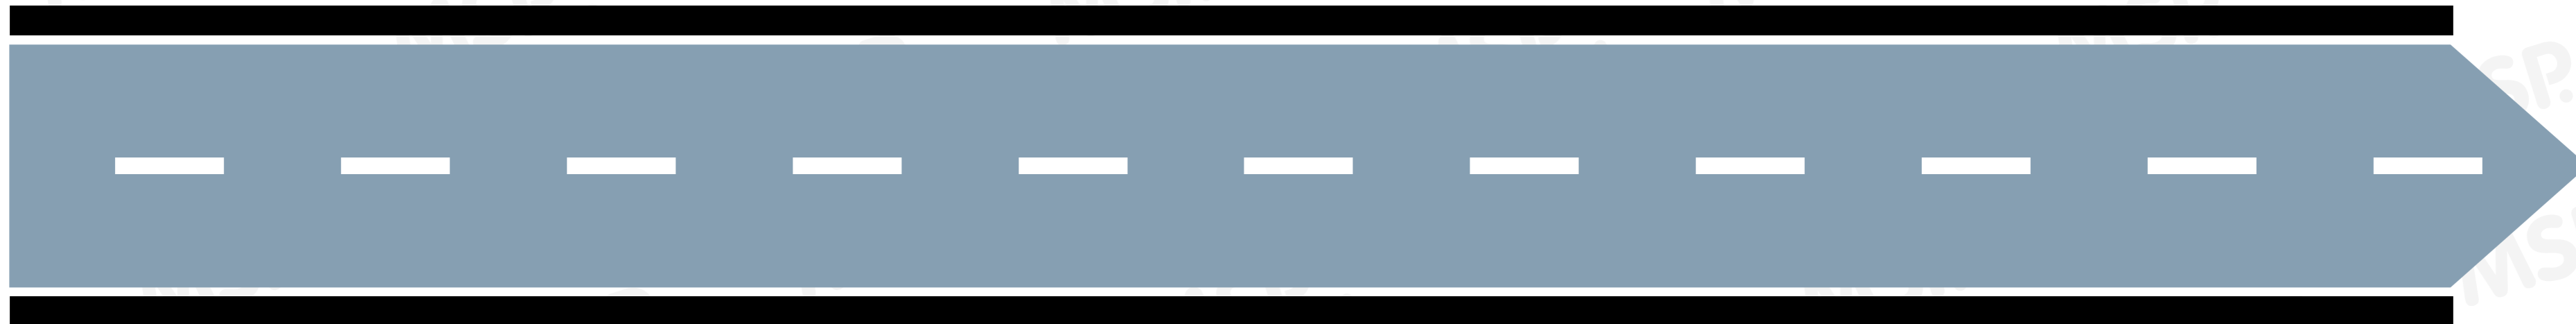

STATUS IM MAI 2023

Die Umsetzung der neuen Infrastruktur ist erfolgt, die Integrationen sind umgesetzt, die Funktionen sind gegeben, allein für die Logistik und die Versandsteuerung fehlt eine Alternative für das M/SD System.

Erkenntnisse sind: ein Greenfield-Ansatz ist aufwendig, die Komplexitäten schwer einzuschätzen, vorhandene Systemalternativen müssen angepasst und erweitert werden, ergänzend ist der Migrationsaufwand zu berücksichtigen.




Die Herren verabreden sich zum Gespräch



VERLAUF DER REISE

Dragos Vlasceanu
besucht das 24.
Bremer
Verlagstreffen ...und
kommt mit Herrn
Greve ins Gespräch...

Mai
2023

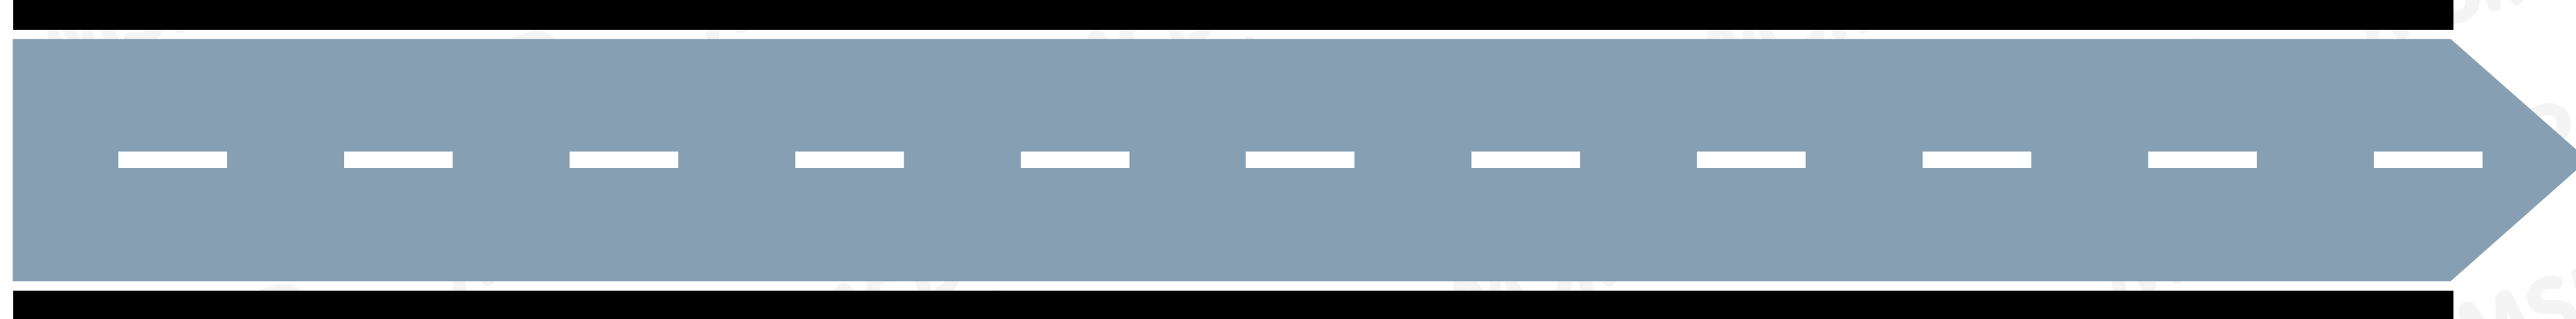

Juni /
Juli
2023

Aschendorff und MSP
treffen sich zu ersten
Gesprächen und
erläutern mögliche
Lösungsszenarien

ANFORDERUNGEN SEITENS ASCHENDORFF

In den gemeinsamen Gesprächen haben sich die nachfolgenden Anforderungen an eine mögliche Zusammenarbeit ergeben – Umsetzung muss aufgrund von vertraglichen Rahmenbedingungen in 2023 erfolgen.



**RZ / Hosting für die
SAP Mediensysteme
MAM und M/SD**



**SAP Basis
Betreuung für die
IS/M System**



**Applikations-
management**



**Lösung für SAP
Lizenzen aufzeigen**

VERLAUF DER REISE

Dragos Vlasceanu besucht das 24. Bremer Verlagstreffen ...und kommt mit Herrn Greve ins Gespräch...

Preisindikation für die definierten Bereiche wird vorgestellt, Vorgespräche mit SAP für Umgang mit Lizenzen beginnen, Projektfreigabe seitens Aschendorff Anfang 09/2023, vorbehaltlich einer Lösung für SAP-Lizenzen

Mai
2023

August
2023

Juni /
Juli
2023

Aschendorff und MSP treffen sich zu ersten Gesprächen und erläutern mögliche Lösungsszenarien, Details zu Systemen, Anforderungen und SAP-Lizenzen werden ausgetauscht

LEISTUNGSUMFANG

RZ / Hosting für die SAP Mediensysteme MAM und M/SD



Übernahme des dreistufigen SAP IS/M (MAM, MSD) Systems in das RZ der MSP, Hosting geht ebenfalls an die MSP über, Neuaufbau Verbindungen, IP-Adressen etc. sind Bestandteil des Projektes

SAP Basis Betreuung für die IS/M System



Die SAP Basis Betreuung übernimmt das experts4Media Team der MSP – Basis ist der Leistungskatalog Medium und wird ergänzt um Aufgaben im Berechtigungsmanagement.

Applikationsmanagement



experts4Media übernimmt das Applikationsmanagement für die IS/M Module – Fokus liegt u.a. auf dem Beilagenversand und Logistik. Bei Bedarf erfolgen auch Neuentwicklungen oder Ergänzungen (z.B. im Bereich Lohn, Beilagenaufträge)

Lösung für SAP Lizenzen aufzeigen



Ziel ist es, eine Teilstillegung der vorhandenen Lizenzen für die SAP-Systeme zu erreichen, um in der Konsequenz eine Reduzierung der laufenden Wartungsbeträge zu erzielen.

Für die Überführung der Systeme in die Betreuung der MSP wird ein Projektbudget vereinbart. Ziel ist es die Systeme bis Ende 2023 vollständig überführt und in Betrieb genommen zu haben.

VERLAUF DER REISE

Dragos Vlasceanu besucht das 24. Bremer Verlagstreffen ...und kommt mit Herrn Greve ins Gespräch...

Mai
2023

Preisindikation für die definierten Bereiche wird vorgestellt, Vorgespräche mit SAP für Umgang mit Lizenzen beginnen, Projektfreigabe seitens Aschendorff Anfang 09/2023, vorbehaltlich einer Lösung für SAP-Lizenzen

August
2023

Systemdetails und Verbindungsstrecken werden erarbeitet, Projektvorgehen detailliert und aufgeplant, erste Test-Übernahme erfolgt, SAP stellt Angebot für Teilstillegung von Lizenzen zur Verfügung

Oktober
2023

Inbetriebnahme der Systeme am 17.12.2023 im RZ der MSP, Aufnahme der Basisbetreuung

Juni /
Juli
2023

Aschendorff und MSP treffen sich zu ersten Gesprächen und erläutern mögliche Lösungsszenarien, Details zu Systemen, Anforderungen und SAP-Lizenzen werden ausgetauscht

Sept-
ember
2023

Übergreifendes Projektteam und Projektstrukturen werden aufgesetzt, Vertragsgespräche mit SAP erfolgen.

No-
vember
2023

Finalisierung der Infrastrukturen, Durchführung einer Generalprobe für den Cut Over, Nachbesserung von gewonnenen Erkenntnissen, Detaillierung und Kommunikation für Go Live

ERREICHTE ZIELE

TRANSFORMATION

SKALIERUNG

STRATEGIE

STABILITÄT

Beibehaltung der strategischen Zielsetzung für die Systemlandschaft möglich

„Role Modell“ für die Idee des Logistik-konzeptes mit SAP M/SD etabliert

Reduzierung von laufenden Betriebskosten

hohe Investitionen in Alternativsystem vermieden

Digitalisierung bleibt im Fokus

RZ-Leistungen verfügbar

Lift & Shift im Münsterland

Sicherung Know-How

stabile logistische Betriebsprozesse für das Printgeschäft

etablierte Zusammenarbeit im Betrieb



VIELEN DANK!

MSP Medien Systempartner GmbH & Co. KG

Martinistr. 33 | 28195 Bremen | Tel.: +49 421 9579 2 | E-Mail: msp@medien-systempartner.de

www.medien-systempartner.de
